Projet M2L : Missions et suivi de projet

1-Missions réalisées au cours du projet

Mission 1 : Conception de la segmentation du réseau :

Accéder au compte rendu

Mission 2 : Maquette réalisée sur Packet Tracer :

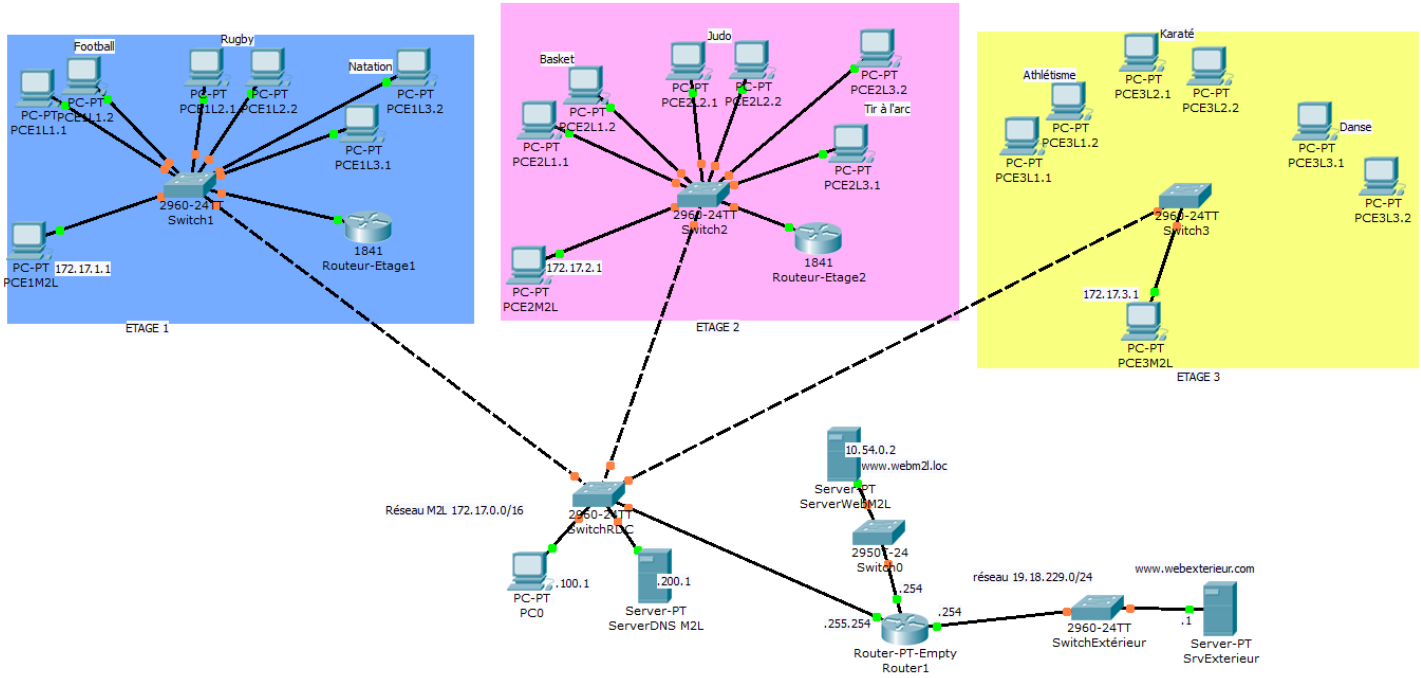

Mission 3 : Réalisation physique :

Accéder au compte rendu

2-Tableau de suivi du projet

Tableau de suivi de la 1ère semaine :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 24/09(fini)
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Du 24/09 au 01/10
Mission 1 – Config Etage1	Mohamed	Le 01/10
Mission 1 – Config Etage2	Omar	Le 01/10
Mission 1 – Config Etage3	Commun	Le 01/10
Mission 2		De 08/10 à 15/10
Mission 3		De 05/11 à 19/11
Mission 4		De 19/11 à 17/12

Tableau de suivi de la 2ème semaine :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 24/09(fini)
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Du 24/09 au 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage1	Mohamed	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage2	Omar	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage3	Commun	Le 01/10(pas à faire)
Mission 2		De 08/10 à 15/10
Mission 3		De 05/11 à 19/11
Mission 4		De 19/11 à 17/12

Tableau de suivi de la 3ème semaine :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 24/09(fini)
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Du 24/09 au 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage1	Mohamed	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage2	Omar	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage3	Commun	Le 01/10(pas à faire)
Mission 2 à détailler comme mission1		De 08/10 à 15/10(en cours)
Mission 3		De 05/11 à 19/11
Mission 4		De 19/11 à 17/12

Tableau de suivi de la 4ème semaine :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 24/09(fini)
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Du 24/09 au 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage1	Mohamed	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage2	Omar	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage3	Commun	Le 01/10(pas à faire)
Mission 2		De 08/10 à 15/10(en retard)
Mission 3 – Correspondance des matériels et interfaces		De 05/11 à 05/11(fini)
Mission 3 – Schéma de câblage physique		De 05/11 à 12/11
Mission 3 – Câblage physique réel		De 12/11 à 19/11
Mission 3 – Les tests		De 19/11 à 19/11
Mission 4		De 19/11 à 17/12

Tableau de suivi de la 5ème semaine :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 24/09(fini)
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Du 24/09 au 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage1	Mohamed	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage2	Omar	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage3	Commun	Le 01/10(pas à faire)
Mission 2		Le 24/09(fini)
Mission 3 – Correspondance des matériels et interfaces	Mohamed	De 05/11 à 05/11(fini)
Mission 3 – Schéma de câblage physique	Omar	De 05/11 à 12/11(fini)
Mission 3 – Câblage physique réel	Commun	De 12/11 à 19/11(en cours)
Mission 3 – Les tests	Commun	De 19/11 à 19/11
Mission 4		De 19/11 à 17/12

Tableau de suivi de la 6ème semaine :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 24/09(fini)
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Du 24/09 au 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage1	Mohamed	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage2	Omar	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage3	Commun	Le 01/10(pas à faire)
Mission 2		Le 24/09(fini)
Mission 3 – Correspondance des matériels et interfaces	Mohamed	De 05/11 à 05/11(fini)
Mission 3 – Schéma de câblage physique	Omar	De 05/11 à 12/11(fini)
Mission 3 – Câblage physique réel	Commun	De 12/11 à 19/11 (en retard, toujours en cours le 26/11)
Mission 3 – Les tests	Commun	De 19/11 à 19/11
Mission 4		De 19/11 à 17/12

Tableau de suivi de la 7ème semaine :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 24/09(fini)
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Du 24/09 au 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage1	Mohamed	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage2	Omar	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage3	Commun	Le 01/10(pas à faire)
Mission 2		Le 24/09(fini)
Mission 3 – Correspondance des matériels et interfaces	Mohamed	De 05/11 à 05/11(fini)
Mission 3 – Schéma de câblage physique	Omar	De 05/11 à 12/11(fini)
Mission 3 – Câblage physique réel	Commun	De 12/11 à 26/11 (fini)
Mission 3 – Les tests	Commun	Le 03/12 au 17/12

Tableau de suivi de la 8ème semaine :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 24/09(fini)
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Du 24/09 au 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage1	Mohamed	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage2	Omar	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage3	Commun	Le 01/10(pas à faire)
Mission 2		Le 24/09(fini)
Mission 3 – Correspondance des matériels et interfaces	Mohamed	De 05/11 à 05/11(fini)
Mission 3 – Schéma de câblage physique	Omar	De 05/11 à 12/11(fini)
Mission 3 – Câblage physique réel	Commun	De 12/11 à 26/11 (fini)
Mission 3 – Les tests	Commun	Le 17/12 (fini) au lieu du 03/12
Mission 4-Recherche et Identification des objectifs de sécurité		De 17/12 à 07/01
Mission 4- Réalisation des tâches des objectifs de sécurité		07/01 à 11/03

Tableau de suivi de la 9ème semaine :

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 24/09(fini)
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Du 24/09 au 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage1	Mohamed	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage2	Omar	Le 01/10(fini)
Mission 1 – Config Etage3	Commun	Le 01/10(pas à faire)
Mission 2		Le 24/09(fini)
Mission 3 – Correspondance des matériels et interfaces	Mohamed	De 05/11 à 05/11(fini)
Mission 3 – Schéma de câblage physique	Omar	De 05/11 à 12/11(fini)
Mission 3 – Câblage physique réel	Commun	De 12/11 à 26/11 (fini)
Mission 3 – Les tests	Commun	Le 17/12 (fini) au lieu du 03/12
Mission 4-Recherche et Identification des objectifs de sécurité		De 17/12 à 07/01(fini)
Mission 4- Réalisation des tâches des objectifs de sécurité		07/01 à 11/03
